



श्री. कृष्णदेवी

Website को (रख्ने)
प्रबोधिनी सुम्निडा उपविधि

श्री. कृष्णदेवी

मेचीनगर नगरपालिकाको

आ.ब २०८१/०८२

को लागि

स्वीकृत पूर्वाधार तर्फका योजनाहरुको

प्रगती बिबरण

नगर सभा मिति : २०८१/१०/१४



मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कोशी प्रदेश, इटहाम, झापा

प्रगति विवरण



बोलपत्र मार्फत सूचना आवाहन भएका योजना (निर्माण र खरिद) संख्या : ६५

बोलपत्र मार्फत सूचना आवाहन भएका योजना (निर्माण) संख्या : ५२

बोलपत्र मार्फत सूचना आवाहन भएका योजना (खरिद) संख्या : १३

भौतिक पूर्वाधार तर्फको प्रगति विवरण

बोलपत्र मार्फत सूचना आवाहन भएका योजना संख्या : ५२

सम्झौता भइ चालु अवस्थामा रहेका योजना संख्या : ३२

सम्झौताको चरणमा रहेको योजना संख्या : ०८

मुल्यांकनको अवस्थामा रहेको योजना संख्या : ११

सूचना आवहान को अवस्थामा रहेको योजना संख्या : ०१

भौतिक पूर्वाधार तर्फको प्रगति विवरण

क) पूर्वाधार तर्फ कुल नगर स्तरीय योजना हरु = ४०

बोलपत्र आवाहन भएको नगरस्तरीय योजनाहरु = ३४

ख) पूर्वाधार तर्फ संधिय ससर्थ तर्फका योजना हरु : १०

बोलपत्र आवाहन भएको संख्या : ०८

बोलपत्र आवाहन हुने बाकी योजनाहरु : ०२

(झापा जिल्ला मेची न.पा. वडा नं. १ मा निर्माणाधीन मदन भण्डारी मार्गको पूर्वी भाग पटापुरमा बसपार्क निर्माण कार्य जग्गा सिमाना यकिन गर्न नसकिएको प्रयास जारी रहेको)

तथा

(टासी फुन छोग छोड् खोरलिङ्ग गुम्बा निर्माण मेचीनगर १३ चारआली झापा – उक्त गुम्बा निर्माण हुने जग्गा सन्धर्भमा गुम्बाको जग्गा स्वामित्व नहुनु)



ग) पूर्वाधार तर्फ प्रदेश ससर्थ तर्फका योजना हरु : ०९

बोलपत्र आवाहन भएको संख्या : ०४

बोलपत्र आवाहन हुने बाकी योजनाहरु : ०५

घ) वडा स्तरीय योजना संख्या:

भौतिक पूर्वाधार तर्फ वडाको योजना संख्या : ३२३

भौतिक पूर्वाधार तर्फ वडाको योजना प्रतिसत : ४८.९%

१. सम्पन्न भएको वडा स्तरीय योजना संख्या : ३१

सम्पन्न भएको वडा स्तरीय योजना प्रतिसत : ९.६० %

२. सम्झौता भइ कार्वान्यन हुदै रहेको वडा स्तरीय योजना संख्या : ९०

सम्झौता भइ कार्वान्यन हुदै रहेको वडा स्तरीय योजना प्रतिसत : २७.८६%

३. ल.इ भइ सम्झौता हुन बाकी वडास्तरीय योजना संख्या : ८४

ल.इ भइ सम्झौता हुन बाकी वडास्तरीय योजना प्रतिसत : २६.०१%

४. ल.इ हुन बाकी रहेको वडास्तरीय योजना संख्या : ११८

ल.इ हुन बाकी रहेको वडास्तरीय योजना प्रतिसत : ३६.५३%

(केहि वडा स्तरीय योजना हरु जग्गा यकिन गर्न नसकिएको , केहि योजनाहरुको सिर्सक परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकोले ल.इ तथा सम्झौता हुन नसकिएको)

वडा स्तरीय बोलपत्र आवाहन भएको योजना संख्या : ०५

बोलपत्र आवहान भइ ठेक्का सम्झौता भएको योजना हरुको भौतिक प्रगतिको औसत प्रतिसत : ३०%

आ.ब २०८१/०८२ को लागि पूर्वाधार विकास शाखाको कार्य तालिका

१. बोलपत्रको सूचना आवहान गर्दा क्र.म .स सधिय ससर्थ र प्रदेश ससर्थ तर्फका ठुला बिस लाख माथिका योजनाहरु पहिलो प्राथमिकतामा परि भाद्र देखि असोज मसान्त भित्र सूचना आवहान भइसकेको ।

२. दोस्रो प्राथमिकतामा नगर स्तरीय बिस लाख माथिका योजनाहरु प्राथमिकता अनुसार असोज देखि कार्तिक मसान्त सम्म सूचना आवहान भइसकेको ।



३. तेस्रोमा वडा स्तरीय ठुला योजना तथा दस लाख माथिको नगरस्तरीय ,प्रदेश स्तरीय योजना प्राथमिकताको आधारमा सूचना कार्तिक देखि पुष मसान्त सम्म सूचना आवाहन भइसकेको ।

४. हाल सम्पूर्ण पाच लाख भन्दा माथि दस लाख सम्मका योजनाहरु लागत अनुमान भइ रहेको र विभिन्न योजनाहरुको बिनियोजन बजेट अभाव भइ एक चरणको कार्य समेत सम्पन्न हुन नसक्ने योजनाहरुको हकमा थप रकम आवस्यक रहेकोले सो सुनिचित भए पछि मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने अवस्था रहेको र सो कुरा हरुलाई मध्ये नजर गर्दै विभिन्न समस्याको कारण बाट सुचारु हुन नसकेका योजना हरु सम्बन्धमा आवस्यक निर्णय भइ माघ मसान्त सम्म खरिद प्रक्रिया बढाई सक्ने लक्ष्य ।

नगर सभा पूर्वाधार विकास समिति तर्फ बाट सुझाबहरु

१. मेचीनगर नगरपालिकाको लागि आ.ब २०८१/०८२ को लागि स्वीकृत बार्षिक योजनाहरु मध्ये प्रदेश सरकार र संघिय सरकार तर्फ बिनियोजन रकम रु ५,००,०००(अक्षरपि पाच लाख) देखि १०,००,०० (दस लाख)सम्मको योजनाहरु अधिकांस मर्मत लगायत अधुरो कार्य गर्नु पर्ने रहेकोले ,उक्त कार्यहरुको जटिलता र स्थानीयको अपनत्व समेत हुने र छोटो समयमै योजना सम्पन्न हुने हुनाले उक्त योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन गराउने राय नगरसभामा पेश गर्दछौ।

२.आ.ब ०८०/०८१ को नगर सभा बाट स्वीकृत बार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा समावेश योजनाहरु सम्झौता भइ कार्वान्यन को चरणमा गइसकेको अवस्था प्राबिधिक कर्मचारीहरु निर्माण कार्यमा बाक्लो आवतजावत गर्नु पर्ने अवस्था रहने तर कार्यालयबाट दिईने इन्धन अपर्याप्त हुने देखिएकोले कार्यबोज, कार्यसम्पादन तथा कार्यप्रकृतिको आधारमा प्राबिधिकलाई दिईने इन्धन सुबिधा बैज्ञानिक रुपमा बढाउन नगर सभामा सिफारिस गर्दछौ ।

३.नगरपालिकाको प्राबिधिक जनसक्तिको क्षयमता विकास गर्न आवस्यक तालिमको लागि रकम बिनियोजन गरि कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन रकम बिनियोजन गर्न नगर सभामा संयोजक मार्फत सुझाब पेश गर्दछौ ।

आ.ब २०८१ /०८२ को लागि स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रममा उल्लेखित बोलपत्र आवहान भएका संघिय ,प्रदेश ,नगरस्तरीय तथा वडा स्तरीय योजना हरु तल उल्लेखित रहेको छ ।



मेचीनगर नगरपालिका

आ.ब. २०८१/८२ का भौतिक पूर्वाधार तर्फ बोलपत्र आवहान भएका नगर स्तरीय योजनाहरु

१	खरिद इकाई कक्ष निर्माण तथा फर्निचर व्यवस्थापन	५०००००.००
२	पूर्वाधार कक्ष निर्माण तथा फर्निचर व्यवस्थापन	५०००००.००
३	प्रशासकीय कक्ष निर्माण	१०००००.००
४	मिनीमाउन्टेन ओरालो बाटो ढलान, मे.न.पा. २	१०००००.००
५	मेरिगोल्ड स्कुलबाट पश्चिम मलेचोकजाने बाटो सम्म कालोपत्रे क्रमागत, मे.न.पा. २ र ३	५०००००.००
६	रातमाटे हर्राबोटे निरगन्जा पैनी निर्माण, मे.न.पा. ३	१५००००.००
७	वडा नं २ र ४ जोड्ने आलडाँगी कल्भर्ट निर्माण, मे.न.पा. ४	२२००००.००
८	जागेश्वरी शिवालय छेउ वालवानी खोलामा कल्भर्ट, मे.न.पा. ४	२०००००.००
९	वाल कल्याण मार्ग, मे.न.पा. ५	८०००००.००
१०	धैलाडुब्बा मन्दिर निर्माण, मे.न.पा. ५	५०००००.००
११	आदर्श टोल मार्ग ड्रेन निर्माण, मे.न.पा. ६	१५००००.००
१२	शान्ति रमाइलो गाउँ भगिरथ राइको घर पश्चिम गणेश वि.क लाइन कल्भर्ट, मे.न.पा. ६	१५००००.००
१३	काली खोला छेउ साकेला मार्ग ब्लक, मे.न.पा. ६	१०००००.००
१४	काकरभिडा बस पार्क लोकमार्ग निस्कने ठाउँमा ब्लक निर्माण, मे.न.पा. ६	१०००००.००
१५	सृजना चोक पश्चिम कल्भर्ट, मे.न.पा. ८	१०००००.००
१६	घोडाजिन स्ल्याव ड्रेन सहित, मे.न.पा. ८	१०००००.००
१७	शिवालय टोल याक्थुम चुम्लुङ्ग भवन जानेवाटो ड्रेन निर्माण, मे.न.पा. ८	१०००००.००
१८	सरस्वति टोल कृष्ण कौशल मार्ग ड्रेन, मे.न.पा. ८	१०००००.००
१९	पशुपति गाउँ तिन तिरे चोक सडक कालोपत्रे क्रमागत, मे.न.पा. ९	६०००००.००
२०	मंजरीटोल सडक ड्रेन निर्माण/ब्लक, मे.न.पा. १०	१०००००.००
२१	धुलावारी मा.वि जाने वाटो ड्रेन निर्माण, मे.न.पा. १०	७०००००.००
२२	निम्तो होटल पुर्ववाट दक्षिण ड्रेन निर्माण, मे.न.पा. १०	५०००००.००
२३	त्रिफला पश्चिम ट्याक्सी स्टेन्डसम्मको सडक प्लम, मे.न.पा. १०	१०००००.००
२४	शहिद मार्गबाट शिवालय मन्दिर अगाडिको बाटो स्तरोन्नति, मे.न.पा. १०	१०००००.००
२५	लवनडाँगी लोवाडी मार्ग कालोपत्रे क्रमागत, मे.न.पा. ११	५०००००.००
२६	वडा कार्यालय भवन निर्माण, मे.न.पा. १२	६०००००.००



२७	सुगम मार्ग ब्लक निर्माण, मे.न.पा. १२		५००००००.००
२८	फुलवाँसा खोला पाथिभारा टोलको अधुरो पुल, मे.न.पा. १३		३००००००.००
२९	प्रणामी मन्दिर पश्चिम गोकुल सुवेदी घर छेउ ड्रेन निर्माण, मे.न.पा. १३		७०००००.००
३०	लक्ष्मीमार्ग मेची राजमार्ग जोड्ने बाटो ड्रेन तथा स्तरोन्नति, मे.न.पा. १३		२००००००.००
३१	रामनगर शान्ति टोल ड्रेन निर्माण, मे.न.पा. १४		१५०००००.००
३२	वडा कार्यालय भवन निर्माण, मे.न.पा. १५		५००००००.००
३३	भूकुटी पश्चिम जाने सडक स्तरोन्नति		१००००००.००
३४	काकरभिडा मावि जाने सडक तथा ड्रेन निर्माण, मे.न.पा. ६		७०००००.००



आ.ब ०८१/०८२ को लागि सघिय सरकार बाट हस्तान्तरित बोलपत्र आवहान भएका योजनाहरु

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च शिर्षक	बजेट	रकम
११.४.२२.१७३९०	झापा जिल्ला मेचीनगर तेलिबारी मैनालीबारी सडक मेनपा १४ साबिक दुवागढी गा.बि.स. बाट राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नति	२६३३६	५०	५००००००.००
११.४.२२.१६८७०	आदर्श मा.वि. बिद्यालय भवन निर्माण	२६३३७	१५०	१५००००००.००
११.४.२२.१८०९४	झापा जिल्ला मेचीनगर १० शान्ति समाज सामुदायिक भवन निर्माण	२६३३६	२५	२५०००००.००
११.४.२२.१७५११	झापा जिल्ला मेचीनगर न.पा. ७ सतिघट्टा बि.ओ.पी. देखि पुरानो माइतीघर र वडा नं ७ कार्यालय मेचीनगर राजमार्ग उत्तर लक्ष्मीनारायण मन्दिर र वडा न. ६ सुनगावा मार्गबाट पश्चिम मोन कटुवालको घर हुँदै कालीखोला तर्फ जाने सडक स्तरोन्नति	२६३३६	५०	५००००००.००
११.४.२२.१७३८९	झापा जिल्ला मेचीनगर ३ खम्बुटार जाने सडक स्तरोन्नती	२६३३६	५०	५००००००.००
११.४.२२.१७५१२	झापा जिल्ला मेचीनगर सुवर्ण मार्ग मे.न.पा ५.६. ८ हुँदै काकरभिट्टा बजार जोड्ने सडक स्तरोन्नती ।	२६३३६	५०	५००००००.००
११.४.२२.१७५१०	झापा जिल्ला मेचीनगर न.पा. वडा नं.७ सतिघट्टा बि.ओ.पि. देखि पुरानो माइतीघर र वडा नं.७ कार्यालय मेचीराजमार्ग उत्तर लक्ष्मीनारायण मन्दिर र वडा नं. ६ सुन.गा.वा. मार्गबाट पश्चिम मोहन कटुवालको घर हुँदै कालीखोला तर्फ जाने बाटो सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य	२६३३६	५०	५००००००.००
११.४.२२.१६९८१	निन्दा रिभर बैंक ईमबैंकमेन्ट निर्माण	२६३३७	१००	१०००००००.००



आ.ब २०८१/०८२ प्रदेश स्तरीय बोलपत्र आवहान भएका योजनाहरु

क्र.स.	कार्यक्रम	खर्च शिर्षक	रकम
११.४.२२.३३६	कृषि तथा पशु हाटवजार निर्माण (वडा न.९)		२५०००००.००
११.१.३.१३०७	अधुरो शान्ति समाज सामुदायिक भवन, मेचीनगर-१०, झापा		७०००००.००
६.२.४.३६५	भान्साखोला सडक निर्माण, मेचीनगर-७		६५०००००.००
६.२.४.३६६	मेचीनगर-४		६५०००००.००

आ.ब २०८१/०८२ वडा स्तरीय बोलपत्र आवहान भएका योजनाहरु

वडा नं	कार्यक्रम	रकम
६	काँकरभिट्टा मा.वि. प्राङ्गणमा इन्टरलक ब्लक लगाउने तथा सौन्दर्यीकरणको कार्य गर्ने	८०००००.००
६	काँकरभिट्टा क्याम्पस प्राङ्गणमा इन्टरलक ब्लक लगाउने तथा सौन्दर्यीकरणको कार्य गर्ने	८०००००.००
९	खुट्टीडाँगी मार्ग	३००००००.००
११	अधुरो छविल मार्ग कालोपत्रे गर्ने	२००००००.००
११	टिमाइ पुल पश्चिम सृजना मार्ग कालो पत्रे	१८५००००.००

आ.व २०८१/८२ को वडा गत योजना हरुको प्रगति विवरण


वडा नं.:	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	कुल संख्या	प्रगति	कैफियत
योजना संख्या :	४४	४२	४५	७३	४१	४२	५२	४८	३१	४७	२७	४१	३६	४५	४६	६६०		केहि योजना
पूर्वाधार तर्फ योजना संख्या :	१९	२६	३०	३४	२४	३४	२७	२४	९	२०	८	११	१३	२३	२१	३२३		हस्ता उम्मा
सम्पन्न भएको :	०	२	४	१	२	९	३	५	०	२	०	०	१	१	५	३१	९.६०%	यकिन नभएको
सम्पन्नता भई कार्यान्वयन भइरहेको :	६	१२	१५	२	४	१५	६	८	२	५	३	२	०	५	५	९०	२७.८६%	तथा केहि
ल.इ. भएको सम्पन्नता हुन बाकी :	९	४	६	१२	७	१	८	८	२	३	२	१	२	४	७	८४	२६.०१%	योजनाहरूको
ल.इ. हुन बाकी :	४	८	५	१९	११	९	१०	३	५	१०	३	०	१०	१३	८	११८	३६.५३%	सिर्लक परिवर्तन हुने भएको

आ.व २०८१/८२ को वडा गत योजना हरुको प्रगति विवरण

वडा नं :	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	कुल संख्या	प्रगति	कैफियत
योजना संख्या :	४४	४२	४५	४३	४१	४२	४२	४८	३१	४७	२७	४१	३६	४५	४६	६६०		केहि योजना हरुमा जग्गा यकिन नभएको तथा केहि योजनाहरुको सिर्षक परिवर्तन हुने
पूर्वाधार तर्फ योजना संख्या :	१९	२६	३०	३४	२४	३४	२७	२४	९	२०	८	११	१३	२३	२१	३२३		
सम्पन्न भएको :	०	२	४	१	२	९	३	५	०	२	०	०	१	१	१	३१	९.६०%	
सम्झौता भई कार्यान्वयन भइरहेको :	६	१२	१५	२	४	१५	६	८	२	५	३	२	०	५	५	९०	२७.८६%	
ल.इ. भएको सम्झौता हुन बाकी :	९	४	६	१२	७	१	८	८	२	३	२	९	२	४	७	८४	२६.०१%	
ल.इ. हुन बाकी :	४	८	५	१९	११	९	१०	३	५	१०	३	०	१०	१३	८	११८	३६.५३%	

नेपाल सरकार
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
इटामडा, भद्रपुर
कोशी प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार तर्फका वडा अन्तर्गत योजनाहरुको अवस्था (१ देखि १५ वडा)

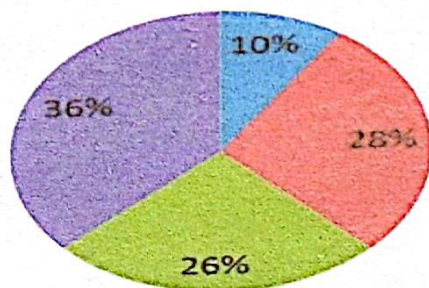

- सम्पन्न भएको योजना
- सम्झौता भई कार्यान्वयन भइरहेको ल.इ. भएको
- सम्झौता हुन बाकी ल.इ. हुन बाकी :

आ.व २०८१/८२ पूर्वाधार तर्फका वडा अन्तर्गत योजनाहरुको अवस्था
